

Oggetto: R: I: Riunione Zona 3 - Martedì 22 settembre ore 21:00

Data: martedì 22 settembre 2015 17:11:38 Ora legale dell'Europa centrale

Da: Roberto Stefani

A: Massimo Spotti

CC: marco.cagnolati@hotmail.it

Le allego la descrizione dei lavori a finire riguardanti la via Sbodio. Le cantierizzazioni sono state decise dalla Polizia Locale.

La fase 3 è terminata oggi e da domani verrà attuata la fase 4.

Tratta di via Sbodio da via Ventura a via Folli

I lavori dal 16 settembre 2015, entrano nella "Fase 3", mediante lo spostamento delle recinzioni di cantiere per permettere chiusura della rotatoria di via Sbodio, via Folli e via De Villard e permettere la prosecuzione della posa del collettore fognario.


Fase 3 (7 giorni dal 16/09/2015)

La terza fase di lavoro prevede la parzializzazione della viabilità in rotatoria di via Sbodio, via Folli e via De Villard per permettere la costruzione della cameretta a 4 vie all'incrocio delle due tubazioni fognarie DN1100 di via Sbodio e di via Folli.

In questa fase l'accesso degli autoveicoli al tratto a fondo chiuso di via Folli avverrà attraverso la creazione di un senso unico alternato sulla corsia di immissione in rotatoria, posizionando i cartelli di segnaletica verticale in accordo con la Polizia Locale Zona 3 Ufficio Lavori Stradali.

L'ingresso al civico 32 di via Folli sarà concesso ai soli residenti e avverrà dal tratto a fondo chiuso di via Sbodio.

L'impresa avrà cura di segnalare i percorsi delle auto e dei pedoni in modo che essi siano divisi e non interferenti.

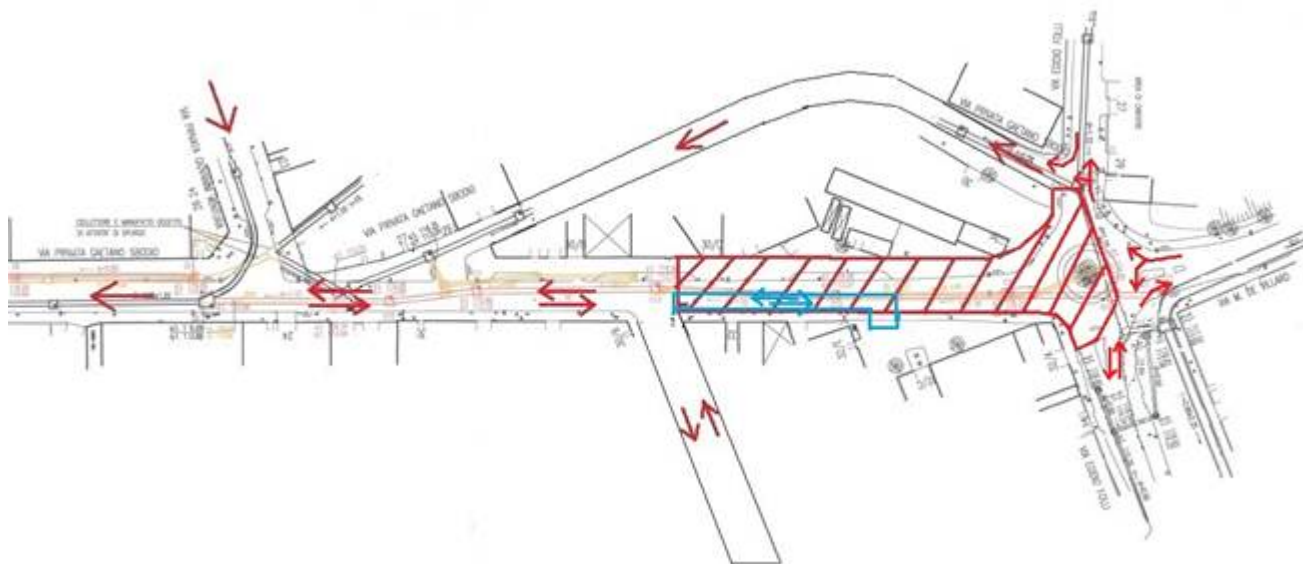

Fase 4 (23 giorni dal 23/09/2015)

La quarta fase di lavoro prevede la chiusura della corsia stradale della rotatoria all'incrocio tra via Folli e via De Villard in direzione Sud e il ripristino parziale della rotatoria stessa per permettere l'accesso degli autoveicoli al tratto a fondo chiuso di via Folli.

L'impresa avrà cura di segnalare i percorsi delle auto e dei pedoni in modo che essi siano divisi e non interferenti.

Prima dello spostamento delle recinzioni di cantiere per il passaggio alla "Fase 4" l'impresa dovrà provvedere all'asfaltatura della sede stradale del tratto di via Sbodio soggetto a riapertura e allo sgombero di tutti i materiali di cantiere eventualmente stoccati, senza lasciare alcun materiale che

